VAN LEENT BOUWBEDRIJF BV

Concept prognose planning
otterschelp
printdatum: woe 11-6-25
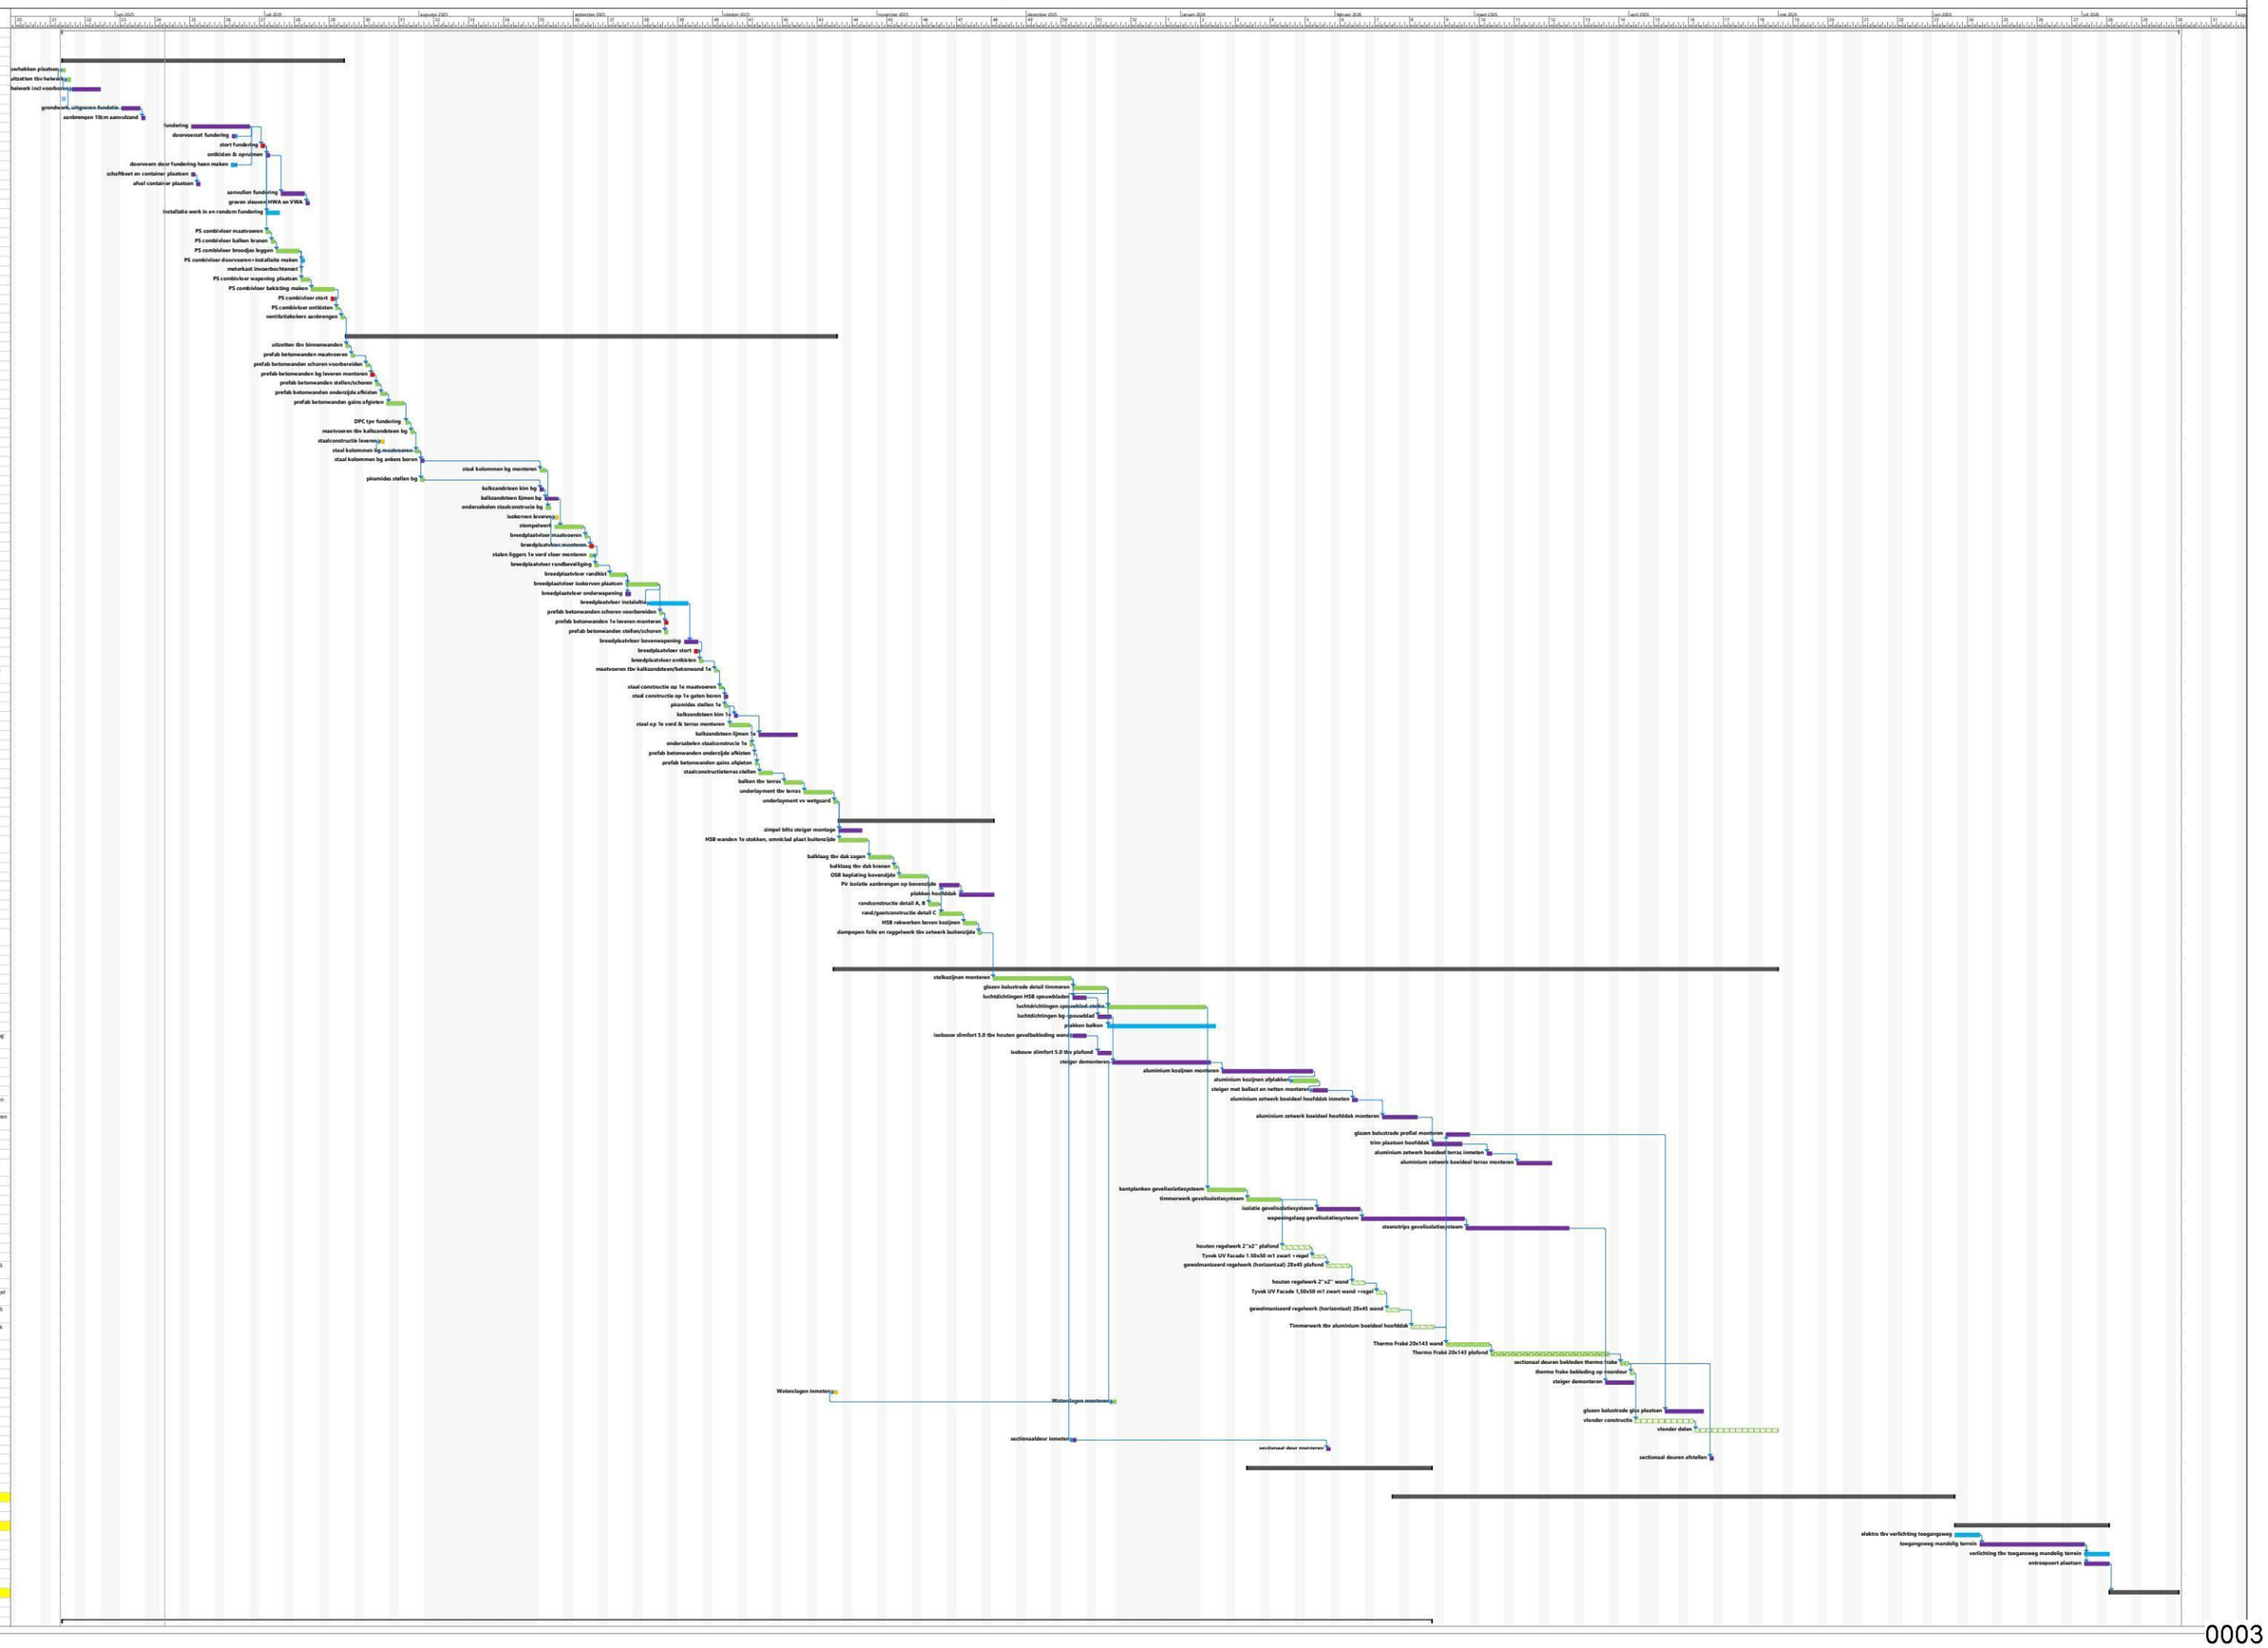
Id	Taaknaam
0	**24615 Otterschelp project planning**
1	
2	
3	**Grondwerk, Kelder & fundering**
4	bouwhekken plaatsen
5	uitzetten tbv hekwerk
6	hekwerk incl voorboren
7	
8	grondwerk, uitgraven fundatie
9	aanbrengen 10cm aanvulzand
10	fundering
11	doorvoerset fundering
12	stort fundering
13	ontkisten & opruimen
14	doorvoem door fundering heen maken
15	schafkeet en container plaatsen
16	afval container plaatsen
17	aanvullen fundering
18	graven sleuven HWA en VWA
19	installatie werk in en rondom fundering
20	
21	PS combivloer maatvoeren
22	PS combivloer balken kranen
23	PS combivloer broodjes leggen
24	PS combivloer doorvoeren+installatie maken
25	meterkast invoerbochtenset
26	PS combivloer wapening plaatsen
27	PS combivloer bekisting maken
28	PS combivloer stort
29	PS combivloer ontkisten
30	ventilatiekokers aanbrengen
31	
32	**Ruwbouw**
33	uitzetten tbv binnenwanden
34	prefab betonwanden maatvoeren
35	prefab betonwanden schoren voorbereiden
36	prefab betonwanden bg leveren monteren
37	prefab betonwanden stellen/schoren
38	prefab betonwanden onderzijde afkisten
39	prefab betonwanden gains afgieten
40	
41	DPC tpv fundering
42	maatvoeren tbv kalkzandsteen bg
43	staalconstructie leveren
44	staal kolommen bg maatvoeren
45	staal kolommen bg ankers boren
46	staal kolommen bg monteren
47	piramides stellen bg
48	kalkzandsteen kim bg
49	kalkzandsteen lijmen bg
50	ondersabelen staalconstrucie bg
51	isokorven leveren
52	stempelwerk
53	breedplaatvloer maatvoeren
54	breedplaatvloer monteren
55	staken liggers 1e verd vloer monteren
56	breedplaatvloer randbeveiliging
57	breedplaatvloer randkist
58	breedplaatvloer isokorven plaatsen
59	breedplaatvloer onderwapening
60	breedplaatvloer installatie
61	prefab betonwanden schoren voorbereiden
62	prefab betonwanden 1e leveren monteren
63	prefab betonwanden stellen/schoren
64	breedplaatvloer bovenwapening
65	breedplaatvloer stort
66	breedplaatvloer ontkisten
67	maatvoeren tbv kalkzandsteen/betonwand 1e
68	staal constructie op 1e maatvoeren
69	staal constructie op 1e gaten boren
70	piramides stellen 1e
71	kalkzandsteen kim 1e
72	staal op 1e verd & terras monteren
73	kalkzandsteen lijmen 1e
74	ondersabelen staalconstrucie 1e
75	prefab betonwanden onderzijde afkisten
76	prefab betonwanden gains afgieten
77	staalconstructieterras stellen
78	balken tbv terras
79	underlayment tbv terras
80	underlayment vv wetguard
81	
82	**Timmer & dakwerk**
83	simpel blitz steiger montage
84	HSB wanden 1e stokken, omniclad plaat buitenzijde
85	balklaag tbv dak zagen
86	balklaag tbv dak kranen
87	OSB beplating bovenzijde
88	Pir isolatie aanbrengen op bovenzijde
89	plakken hoofddak
90	randconstructie detail A, B
91	rand/gootconstructie detail C
92	HSB rekwerken boven kozijnen
93	dampopen folie en raggelwerk tbv zetwerk buitenzijde
94	
95	
96	**Gevelwerk & Afwerking buiten**
97	stelkozijnen monteren
98	glazen balustrade detail timmeren
99	luchtdichtingen HSB spouwbladen
100	luchtdichtingen spouwblad-dakko
101	luchtdichtingen bg-spouwblad
102	plakken balkon
103	isobouw slimfort 5.0 tbv houten gevelbekleding wand
104	isobouw slimfort 5.0 tbv plafond
105	steiger demonteren
106	aluminium kozijnen monteren
107	aluminium kozijnen afplakken
108	steiger met ballast en netten monteren
109	aluminium zetwerk boeideel hoofddak inmeten
110	aluminium zetwerk boeideel hoofddak monteren
111	glazen balustrade profiel monteren
112	trim plaatsen hoofddak
113	aluminium zetwerk boeideel terras inmeten
114	aluminium zetwerk boeideel terras monteren
115	
116	kantplanken gevelisolatiesysteem
117	timmerwerk gevelisolatiesysteem
118	isolatie gevelisolatiesysteem
119	wapeningslag gevelisolatiesysteem
120	steenstrips gevelisolatiesysteem
121	
122	houten regelwerk 2"x2" plafond
123	Tyvek UV Facade 1,50x50 m1 zwart +regel
124	gewolmaniseerd regelwerk (horizontaal) 28x45 plafond
125	houten regelwerk 2"x2" wand
126	Tyvek UV Facade 1,50x50 m1 zwart wand +regel
127	gewolmaniseerd regelwerk (horizontaal) 28x45 wand
128	Timmerwerk tbv aluminium boeideel hoofddak
129	Thermo Frakê 20x143 wand
130	Thermo Frakê 20x143 plafond
131	sectionaal deuren bekleden thermo frakê
132	thermo frakê bekleding op voordeur
133	steiger demonteren
134	Waterslagen inmeten
135	Waterslagen monteren
136	glazen balustrade glas plaatsen
137	vlonder constructie
138	vlonder delen
139	sectionaaldeur inmeten
140	sectionaal deur monteren
141	sectionaal deuren afstellen
142	**Werkzaamheden tbv zand cementvloer**
160	
161	
162	**Afbouw**
187	
202	
203	**Terreinindrichting**
204	elektra tbv verlichting toegangsweg
205	toegangsweg mandelig terrein
206	verlichting tbv toegangsweg mandelig terrein
207	entreeport plaatsen
208	
209	
210	**Oplevering**
220	
221
